KEMENTRIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
BALAI BESAR PELAKSANAAN JALAN NASIONAL (BBPJN) VI
Jalan Sapta Taruna Raya No. 21 Kompleks PU Pasar Jumat, Jakarta Selatan 12310
Telp. (021) 7506548, (021) 7506558, Email: balai.jalanjkt@gmail.com

2019

EVALUASI PELAKSANAAN ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI JAWA BARAT

LAPORAN PROGRAM MUTU



PT. SARANA MULTI DAYA
ENGINEERING CONSULTANT
Komplek Ruko Prima Jl. RS. Fatmawati No. 26 J
Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
Telp. 021-75816975 Fax. 021-75910420

KATA PENGANTAR

Sebagai bentuk partisipasi dalam Pembangunan Negara, khususnya dalam proyek-proyek di bidang Bina Marga, maka Konsultan mengajukan Program Mutu untuk pelaksanaan pekerjaan "Evaluasi Pelaksanaan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Barat", PPK Preservasi dan Peralatan II, Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI (BBPJN VI), Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Program Mutu ini merupakan satu kesatuan dengan dokumen-dokumen lain untuk memenuhi persyaratan dalam melaksanakan pekerjaan yang juga merupakan perwujudan dari pemahaman konsultan terhadap lingkup pekerjaan yang dimaksud. Program Mutu berisi uraian umum tentang pekerjaan dan uraian teknis yang mencakup metodologi dan rencana kerja konsultan.

Semoga Program Mutu ini dapat memberikan informasi yang cukup atas rencana kegiatan dan gambaran hasil yang direncanakan dalam pekerjaan "Evaluasi Pelaksanaan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Barat", PPK Preservasi dan Peralatan II, Satker Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI (BBPJN VI), Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Jakarta, Mei 2019

Direktur

LEMBAR PENGESAHAN

DESKRIPSI	DISUSUN OLEH	DIPERIKSA OLEH	DISAHKAN OLEH
Nama	**Ir. Hernu Pramono**	**Apri Artoto, ST, MPPM**	**Dr.Ir.Hari Suko Setiono,M.SC**
Tanda Tangan			
Jabatan	*Direktur*	PPK Preservasi dan Peralatan II	Kepala Satker BBPJN VI
Tanggal	Mei 2019	Mei 2019	Mei 2019

LAPORAN PROGRAM MUTU

Paket:

Evaluasi Pelaksanaan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Barat

Nomor Kontrak: 456/HK.02.03/PRESLANII.01/Bv/2019

Tanggal 16 Mei 2019

Daftar Distribusi Dokumen:			
No	**Penerima**	**Tanda Tangan**	**Tanggal**
1	PPK Preservasi dan Peralatan II, Satker BBPJN VI		
2	*Project Officer*		

Status Dokumen			
STATUS:	PT. SARANA MULTI DAYA		
Tanggal:	Mei 2019		

RIWAYAT DOKUMEN

TANGGAL	CATATAN PERUBAHAN	KETERANGAN
Mei 2019	Laporan program mutu diterbitkan perdana	

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

LEMBAR PENGESAHAN ii

RIWAYAT DOKUMEN iii

DAFTAR ISI iv

BAB I PENDAHULUAN 6

1.1 Umum 6

1.2 Latar Belakang 6

1.3 Maksud, Tujuan, dan Sasaran 7

1.3.1 Maksud 7

1.3.2 Tujuan 7

1.3.3 Sasaran 7

BAB II INFORMASI KEGIATAN 9

2.1 Data Kegiatan 9

2.2 Ruang Lingkup Pekerjaan 10

2.3 Keluaran 11

2.4 Lokasi Kegiatan 11

BAB III SASARAN MUTU KEGIATAN 12

BAB IV STRUKTUR ORGANISASI 13

BAB V TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB 14

BAB VI METODOLOGI, PROGRAM KERJA, DAN BAGAN ALIR 18

6.1 Pendekatan 18

6.2 Metodologi 22

6.2.1 Diagram Alur Kegiatan 22

6.2.2 Diagram Alur Pekerjaan 23

6.2.3 Persiapan 24

6.2.4 Tahap Pengumpulan Data 24

6.2.5 Tahapan Analisis 25

6.2.6 Tahapan Kesimpulan dan Rekomendasi 29

BAB VII JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN 31

BAB VIII JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI 33

BAB IX JADWAL ARUS KAS 37

BAB X RENCANA, METODE VERIFIKASI, VALIDASI, MONITORING, EVALUASI, INSPEKSI, DAN KRITERIA PENERIMAAN 38

BAB XI DAFTAR KRITERIA PENERIMAAN 39

BAB XII DAFTAR INDUK DOKUMEN 40

BAB XIII DAFTAR INDUK REKAMAN 41

BAB XIV DAFTAR SIMAK 42

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Umum

Program Mutu adalah dokumen yang dibuat oleh Penyedia yang memerincikan proses untuk menunjukkan kemampuan organisasi dalam mengerahkan sumber dayanya guna mencapai tujuan pada suatu proyek. RMK diserahkan selambat – lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal mulai kerja sesuai SPMK sesuai dengan dokumen Kerangka Acuan Kerja (KAK).

1.2 Latar Belakang

Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI (BBPJN VI) merupakan Unit Pelaksana Teknis di Direktorat Jenderal Bina Marga yang dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/KPTS/M/2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum.

Bidang Preservasi dan Peralatan II sebagai salah satu unit kerja di Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional VI memiliki tugas sebagai berikut:

a. Melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan.
b. Pelaksanaan Penyesuaian Kontrak Pekerjaan Preservasi Jalan dan Jembatan
c. Pelaksanaan pengadaan, penyediaan, pemanfaatan, penyimpanan, dan pemeliharaan bahan dan peralatan jalan dan jembatan.

Sebagaimana fungsinya sebagai Bidang Preservasi dan Peralatan II pada butir b) pada pasal 101 memiliki tugas Pengendalian dan Pelaksanaan Analisis Harga Satuan Pekerjaan Jalan dan Jembatan agar dapat dimanfaatkan secara tepat guna.

Berkaitan dengan hal tersebut maka Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VI, Ditjen Bina Marga perlu melakukan evaluasi pelaksanaan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Preservasi Jalan dan Jembatan yang ada di Provinsi Jawa Barat terkait Pengendalian dan Pelaksanaan pekerjaan Paket Long Segment.

1.3 Maksud, Tujuan, dan Sasaran

1.3.1 Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah:

1. Mengumpulkan data perhitungan biaya Analisa Harga Satuan Pekerjaan Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Barat
2. Melakukan evaluasi hasil perhitungan komponen biaya Analisa Harga Satuan Preservasi Jalan dan Jembatan terhadap kinerja hasil pelaksanaan di lapangan (tepat mutu, waktu, biaya)
3. Memberikan Rekomendasi teknis terkait hasil evaluasi pelaksanaan Analisa Harga Satuan Pekerjaan pada pekerjaan long segment.

1.3.2 Tujuan

Tujuan Kegiatan adalah untuk membantu Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VI menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam melakukan melaksanakan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan.

1.3.3 Sasaran

Sasaran kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Preservasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Jawa Barat ini adalah:

a. Terkumpulnya data komponen biaya Analisa Harga Satuan Pekerjaan Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa Barat

b. Teridentifikasinya permasalahan yang muncul dalam perhitungan biaya pekerjaan Preservasi Jalan dan Jembatan terhadap kinerja hasil pelaksanaan di lapangan pada Provinsi Jawa Barat

c. Tersedianya Rekomendasi teknis terkait hasil evaluasi pelaksanaan Analisa Harga Satuan Pekerjaan pada pekerjaan long segment

BAB II
INFORMASI KEGIATAN

2.1 Data Kegiatan

Nama Kegiatan	:	Evaluasi Pelaksanaan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Preservasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Jawa Barat
Lokasi Kegiatan	:	Kegiatan ini berpusat di Jakarta dengan wilayah kerja pada ruas jalan nasional di Provinsi Jawa Barat (Satker PJN di Provinsi Jawa Barat di bawah Bidang Preservasi dan Peralatan II)
Waktu Pelaksanaan	:	Selama 150 (Seratus Lima Puluh) hari kalender terhitung sejak dikeluarkannya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)
Sumber Pendanaan	:	Kegiatan ini dibiayai dari sumber pendanaan DIPA APBN Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VI Tahun Anggaran 2018
Nomor Kontrak	:	456/HK.02.03/PRESLANII.01/Bv/2019
Tanggal Kontrak	:	16 Mei 2019
Nomor SPMK	:	UM.01.03/PRESLANII.01-BV/466
Tanggal SPMK	:	20 Mei 2019
Total Kontrak	:	Rp 909.205.000,00
Nama Pengguna Jasa	:	Satuan Kerja Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) VI, Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Alamat Pengguna Jasa	:	Jalan Sapta Taruna Raya No. 21 Kompleks PU Pasar Jumat, Jakarta Selatan

Nama Penyedia Jasa : PT. Sarana Multi Daya

Alamat Penyedia Jasa : Jl. RS Fatmawati NO 26/J- Pondok Labu, Jakarta Selatan

Sistem Kontrak : *Lump Sum*

Team Leader : Ir. Prijambodo, MT

2.2 Ruang Lingkup Pekerjaan

Lingkup kegiatan ini, meliputi:


a. Melakukan kajian literatur mengenai kegiatan Preservasi Jalan dan Jembatan dengan skema long segment (lingkup Rutin Jalan dan Jembatan, rehabilitasi Jalan, rekonstruksi Jalan, dan pelebaran jalan menuju standar).
b. Melakukan kajian literatur mengenai komponen biaya dan harga satuan pada program Analisa Harga Satuan Pekerjaan (AHSP).
c. Melakukan pengumpulan data komponen biaya Analisa Harga Satuan Pekerjaan Preservasi Jalan dan Jembatan (Satker PJN di Provinsi Jawa Barat di bawah Bidang Preservasi dan Peralatan II) berupa dokumen penawaran pemenang kontrak Longsegment, Analisa Harga Satuan Mata Pembayaran Utama.
d. Identifikasi permasalahan yang muncul dalam perhitungan biaya pekerjaan Preservasi Jalan dan Jembatan terhadap kinerja hasil pelaksanaan di lapangan pada Provinsi Jawa Barat.
e. Menganalisa tingkat sensitifitas harga pekerjaan terhadap kinerja hasil pelaksanaan.
f. Memberikan rekomendasi teknis terhadap permasalahan dan ketidaksesuaian yang muncul dalam perhitungan biaya pekerjaan Preservasi Jalan dan Jembatan berdasarkan aturan yang berlaku.

2.3 Keluaran

Keluaran dari Paket Pekerjaan ini adalah tersedianya rekomendasi teknis terhadap permasalahan yang muncul dalam perhitungan biaya pekerjaan Preservasi Jalan dan Jembatan berdasarkan aturan yang berlaku.

2.4 Lokasi Kegiatan

Lokasi kegiatan berpusat di Jakarta degan wilayah kerja pada ruas jalan nasional di Provinsi Jawa Barat (Satker PJN di Provinsi Jawa Barat di bawah Bidang Preservasi dan Peralatan II).

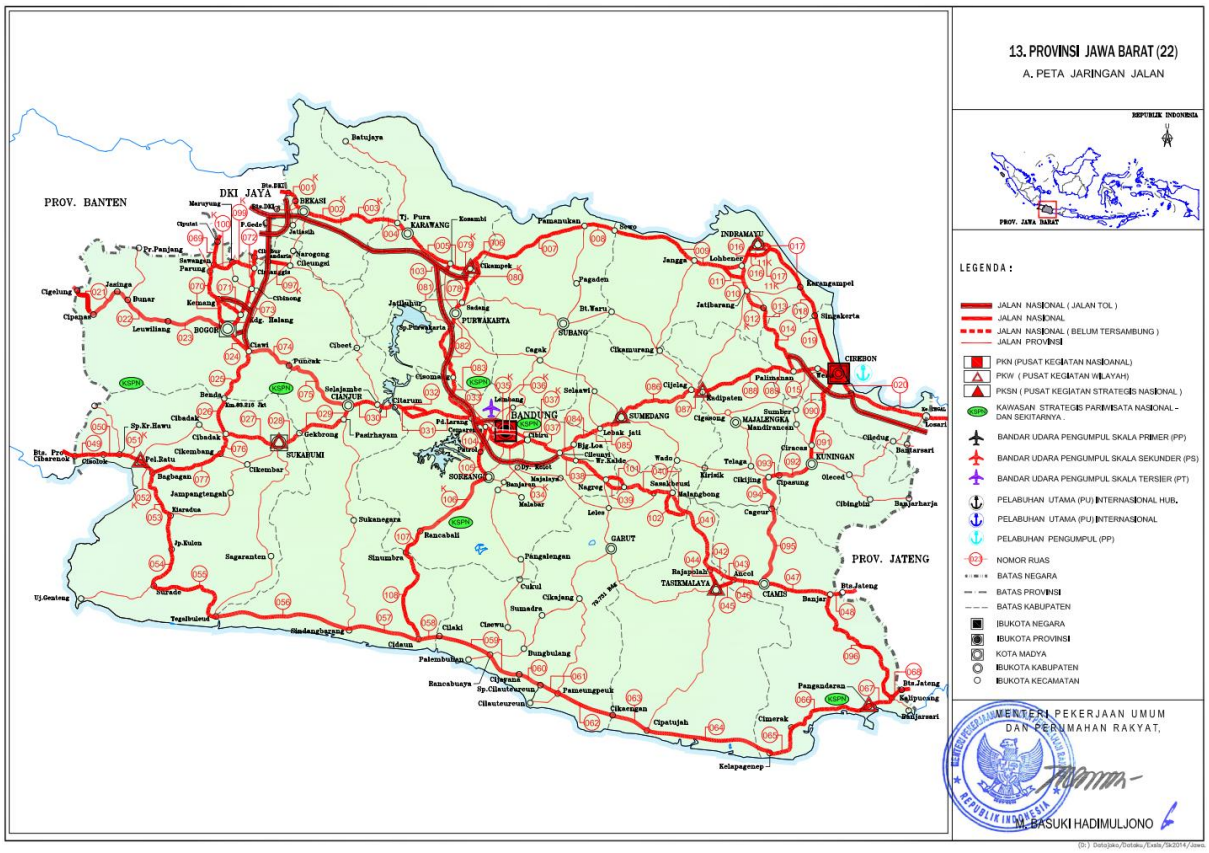

Gambar 1 Peta Jalan Nasional Provinsi Jawa Barat

BAB III
SASARAN MUTU KEGIATAN

RMK ini dibuat untuk memberikan jaminan kepada Pemberi Tugas, tentang bagaimana PT. Sarana Multi Daya melalui timnya yang diberi kepercayaan untuk melaksanakan kegiatan pelaksanaan pekerjaan ini sehingga target kegiatan dapat dicapai sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. PT. Sarana Multi Daya memiliki komitmen yang tinggi untuk melakukan pengendalian kegiatannya dengan menerapkan sistem manajemen mutu, dalam skala dan bobot yang sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang dihadapi, sekalipun tanpa diminta oleh Pengguna Jasa.

Selain dari persyaratan yang ditetapkan oleh Pengguna Jasa, RMK ini sekaligus dipersiapkan untuk kepentingan internal organisasi konsultan, untuk digunakan sebagai panduan pelaksanaan kegiatan.

Tim Konsultan PT. Sarana Multi Daya sangat menyadari tuntutan mutu sebagaimana yang dinyatakan dalam peraturan perundang-undangan yang mewajibkan konsultan untuk membuat RMK sebelum melaksanakan kegiatannya, agar kegiatan dapat terkendali dan mencapai target/sasaran sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan.


PT. Sarana Multi Daya telah mendokumentasikan, menerapkan, memelihara Sistem Manajemen Mutu yang telah ditetapkan dan akan dilakukan penyempurnaan aktivitas Sistem Manajemen Mutu secara terus-menerus berdasarkan standard **ISO 9001:2000**.

Tujuan manajemen mutu PT. Sarana Multi Daya, yaitu: Meningkatkan kepuasan pelanggan melalui aplikasi sistem secara efektif termasuk proses perbaikan berkesinambungan dari sistem dan kepastian kesesuaiannya dengan persyaratan pelanggan serta peraturan yang berlaku.

BAB IV
STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi konsultan pekerjaan Evaluasi Pelaksanaan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Preservasi Jalan dan Jembatan Provinsi Jawa ini didasarkan pada kepentingan dan prioritas dari jenis kegiatan dan juga berdasar pada Kerangka Acuan Kerja.

Untuk penyelenggaraan seluruh tugas-tugas layanan konsultansi dilaksanakan oleh seluruh team pelaksana tugas yang terkait dengan tugas/aktivitasnya yang dikoordinir/ dipimpin oleh Team Leader.

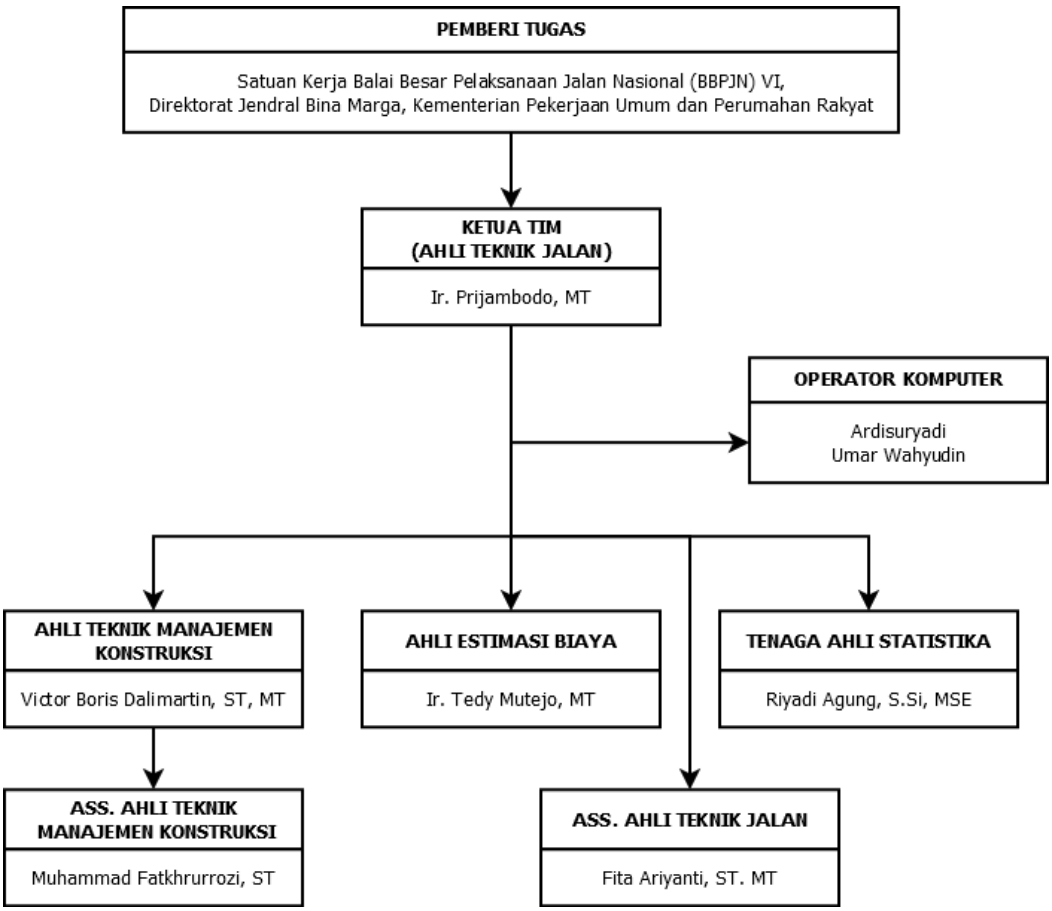

Gambar 2 Struktur Organisasi Pekerjaan

BAB V
TUGAS, WEWENANG, DAN TANGGUNG JAWAB

Secara garis besar tugas dan tanggung jawab masing-masing tenaga ahli, antara lain sebagai berikut :

A. Ketua Tim (1 orang)

Disyaratkan minimal seorang Sarjana Teknik Strata dua (S2) Jurusan Sipil dengan latar belakang pendidikan S1 Sipil, lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.

Mempunyai sertifikat keahlian (SKA) Ahli Utama Teknik Jalan (pengalaman profesi Ahli Utama 2 tahun) yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi dengan melampirkan SKA yang berlaku, telah diregistrasi oleh LPJK dan memiliki pengalaman kerja yang sesuai minimal selama 2 tahun.

Tugas dan tanggung jawab utamanya adalah memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim dalam pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai, serta bertanggung jawab penuh terhadap produk yang dihasilkan.

B. Tenaga Ahli Teknik Manajemen Konstruksi (1 orang)

Disyaratkan minimal seorang Sarjana Teknik Strata Dua (S2) Jurusan Sipil dengan latar belakang Pendidikan S1 Sipil, lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.

Mempunyai sertifikat keahlian (SKA) Ahli Muda Teknik Manajemen Konstruksi (pengalaman profesi Ahli Madya 2 tahun) yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi dengan melampirkan SKA yang berlaku, telah diregistrasi oleh LPJK dan memiliki pengalaman kerja yang sesuai minimal selama 2 tahun.

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut.

1. Melakukan kajian pustaka dan peraturan perundang-undangan terkait dengan kebijakan preservasi jalan dan jembatan dengan skema longsegment.
2. Menyusun data paket pekerjaan terkait preservasi jalan dan jembatan dengan skema longsegment selama beberapa tahun terakhir.
3. Melakukan inventarisasi yang dibutuhkan terkait biaya preservasi jalan dan jembatan dengan skema longsegment.
4. Menganalisa komponen teknis pekerjaan jalan dan mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam perhitungan biaya pekerjaan Preservasi Jalan dan Jembatan terhadap kinerja hasil pelaksanaan di lapangan pada Provinsi Jawa Barat.

C. Tenaga Ahli *Quantity* / Estimasi Biaya (1 orang)

Disyaratkan minimal seorang Sarjana Teknik Strata Dua (S2) Jurusan Sipil dengan latar belakang Pendidikan S1 Sipil, lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi.

Mempunyai sertifikat keahlian (SKA) Ahli Manajemen Proyek (pengalaman profesi Ahli Muda 2 tahun) yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi dengan melampirkan SKA yang berlaku, telah diregistrasi oleh LPJK dan memiliki pengalaman kerja yang sesuai minimal selama 1 tahun.

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut.

1. Melakukan kajian pustaka dan peraturan perundang-undangan terkait dengan kebijakan preservasi jalan dan jembatan dengan skema longsegment.
2. Melakukan inventarisasi data yang dibutuhkan terkait biaya preservasi jalan dan jembatan.
3. Menganalisa komponen teknis pekerjaan jalan dan mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam perhitungan biaya pekerjaan Preservasi Jalan dan Jembatan terhadap kinerja hasil pelaksanaan di lapangan pada Provinsi Jawa Barat.

D. Tenaga Ahli Statistik (1 orang)

Disyaratkan seorang Sarjana Teknik Strata satu (S1) Statistika / Matematika, lulusan universitas/perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang telah diakreditasi atau yang telah lulus ujian negara atau perguruan tinggi luar negeri yang telah diakreditasi dan mempunyai pengalaman kerja yang sesuai minimal selama 6 tahun.

Tugas dan tanggung jawabnya adalah sebagai berikut.

1. Melakukan kajian pustaka dan peraturan perundang-undangan terkait dengan kebijakan preservasi jalan dan jembatan dengan skema longsegment.
2. Melakukan inventarisasi yang dibutuhkan terkait biaya preservasi jalan dan jembatan dengan skema longsegment.
3. Menyusun grafik, hasil telaah data, dan alat bantu lainnya yang digunakan untuk analisa laporan dan rekomendasi keluaran.

E. Tenaga Sub Profesional

Untuk membantu kelancaran pekerjaan, masing-masing tenaga ahli akan dibantu tenaga sub professional, antara lain:

1. Ketua tim dibantu asisten lulusan S1 Teknik Sipil yang telah berpengalaman di bidangnya minimal 2 tahun sejak lulus.
2. Tenaga Ahli Manajemen Konstruksi dibantu asisten lulusan S1 Teknik Sipil yang telah berpengalaman di bidangnya minimal 2 tahun sejak lulus.

F. Tenaga Pendukung

Selain tenaga-tenaga tersebut di atas, juga diperlukan tenaga-tenaga pendukung/tenaga lainnya untuk membantu kelancaran kegiatan administrasi Teknik dan korespondensi, terdiri dari Operator Komputer sejumlah 2 orang minimal lulusan SMA/SMK berpengalaman di bidangnya minimal 2 tahun.

BAB VI
METODOLOGI, PROGRAM KERJA, DAN BAGAN ALIR

6.1 Pendekatan

Untuk melaksanakan pekerjaan evaluasi pelaksanaan analisa harga satuan pekerjaan preservasi jalan dan jembatan diperlukan pendekatan melalui aspek-aspek yang relevan dalam rangka mengidentifikasi faktor-faktor kajian dan lingkup kebutuhan datanya. Secara garis besar metodologi yang digunakan mencakup tahap analisis komponen, pengumpulan data, analisis perhitungan biaya dan keluaran berupa rekomendasi.

Evaluasi adalah suatu alat atau prosedur yang digunakan untuk mengetahui dan mengukur sesuatu dalam suasana dengan cara dan aturan-aturan yang sudah ditentukan. Sedangkan evaluasi program adalah aktivitas investigasi yang sistematis tentang sesuatu yang berharga dan bernilai dari suatu objek.

Evaluasi program merupakan suatu proses. Secara eksplisit evaluasi mengacu pada pencapaian tujuan sedangkan secara implisit evaluasi harus membandingkan apa yang telah dicapai dari program dengan apa yang seharusnya dicapai berdasarkan standar yang telah ditetapkan. Dalam studi tentang evaluasi, banyak sekali dijumpai model-model evaluasi dengan format atau sistematika yang berbeda, sekalipun dalam beberapa model ada juga yang sama.

Ada banyak model evaluasi program yang dikembangkan oleh para ahli yang dapat dipakai untuk mengevaluasi program. Model-model tersebut di antaranya : Discrepancy Model (Provus), CIPP Model (Daniel Stufflebeam's), Responsive Evaluation Model (Robert Stake's), FormativeSumatif Evaluation Model (Michael Scriven's), Measurement Model (Edward L. Thorndike dan Robert L. Ebel), dan Goal-Free Evaluation Approach (Michael Scriven's). Kegiatan penilaian dalam evaluasi program tidak hanya dilaksanakan pada akhir kegiatan

program, tetapi sebaiknya dilakukan sejak awal, yaitu dari penyususnan rancangan program, pelaksanaan program dan hasil dari program tersebut.

Berbagai model evaluasi tersebut dapat digunakan tergantung kepada tujuan evaluasi yang ditetapkan. Namun demikian, perlu juga diketahui bahwa keberhasilan suatu evaluasi program secara keseluruhan bukan hanya dipengaruhi penggunaan yang tepat pada sebuah model evaluasi melainkan juga dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Perkembangan model evaluasi termasuk suatu fenomena yang menarik. Setelah Tyler mengemukakan model black box tahun 1949, belum terlihat ada model lain yang muncul ke permukaan. Lebih kurang 10 tahun lamanya, orangorang yang melakukan kegiatan evaluasi hanya menggunakan model evaluasi tersebut. Hal ini mungkin disebabkan evaluasi belum menjadi studi tersendiri. Ketika itu, orang banyak mempelajari evaluasi dari psikometrik dengan kajian utamanya adalah tes dan pengukuran. Evaluasi lebih banyak diarahkan kepada dimensi hasil, belum masuk ke dimensi-dimensi lainnya. Oleh sebab itu, janganlah heran bila evaluasi banyak dilakukan oleh orang-orang yang “terbentuk” dalam tes dan pengukuran. Studi tentang evaluasi belum begitu menarik perhatian orang banyak, karena kurang memiliki nilai praktis.

Dalam studi tentang evaluasi, banyak sekali dijumpai model-model evaluasi dengan format atau sistematika yang berbeda, sekalipun dalam beberapa model ada juga yang sama. Ada banyak model evaluasi program yang dikembangkan oleh para ahli yang dapat dipakai untuk mengevaluasi program. Model-model tersebut di antaranya:

1. Discrepancy Model (Provus)

   Evaluasi model kesenjangan (discrepancy model) menurut Provus (dalam Fernandes, 1984) adalah untuk mengetahui tingkat kesesuaian antara baku (standard) yang sudah ditentukan dalam program dengan kinerja (performance) sesungguhnya dari program

tersebut. Baku adalah kriteria yang ditetapkan, sedangkan kinerja adalah hasil pelaksanaan program.

Sedangkan kesenjangan yang dapat dievaluasi dalam program meliputi:

a. Kesenjangan antara rencana dengan pelaksanaan program;
b. Kesenjangan antara yang diduga atau diramalkan akan diperoleh dengan yang benar-benar direalisasikan;
c. Kesenjangan antara status kemampuan dengan standar kemampuan yang ditentukan;
d. Kesenjangan tujuan;
e. Kesenjangan mengenai bagian program yang dapat diubah; dan
f. Kesenjangan dalam sistem yang tidak konsisten. Oleh karena itu model evaluasi ini memiliki lima tahap yaitu desain, instalasi, proses, produk dan membandingkan.

2. CIPP Model (Daniel Stufflebeam's)

Model CIPP (Context, Input, Process, dan Product) merupakan model evaluasi di mana evaluasi dilakukan secara keseluruhan sebagai suatu sistem. Evaluasi model CIPP merupakan konsep yang ditawarkan oleh Stufflebeam dengan pandangan bahwa tujuan penting evaluasi adalah bukan membuktikan tetapi untuk memperbaiki (Stufflebeam, H McKee and B McKee, 2003:118). Evaluasi model CIPP dapat diterapkan dalam berbagai bidang.


Nana Sudjana dan Ibrahim (2004:246) menterjemahkan masing-masing dimensi tersebut dengan makna sebagai berikut:

a. Context: situasi atau latar belakang yang mempengaruhi perencanaan program pembinaan.


b. Input: kualitas masukan yang dapat menunjang ketercapaian program pembinaan.
c. Process: pelaksanaan program dan penggunaan fasilitas sesuai dengan apa yang telah direncanakan.
d. Product: hasil yang dicapai dalam penyelenggaraan program tersebut.

6.2 Metodologi

6.2.1 Diagram Alur Kegiatan

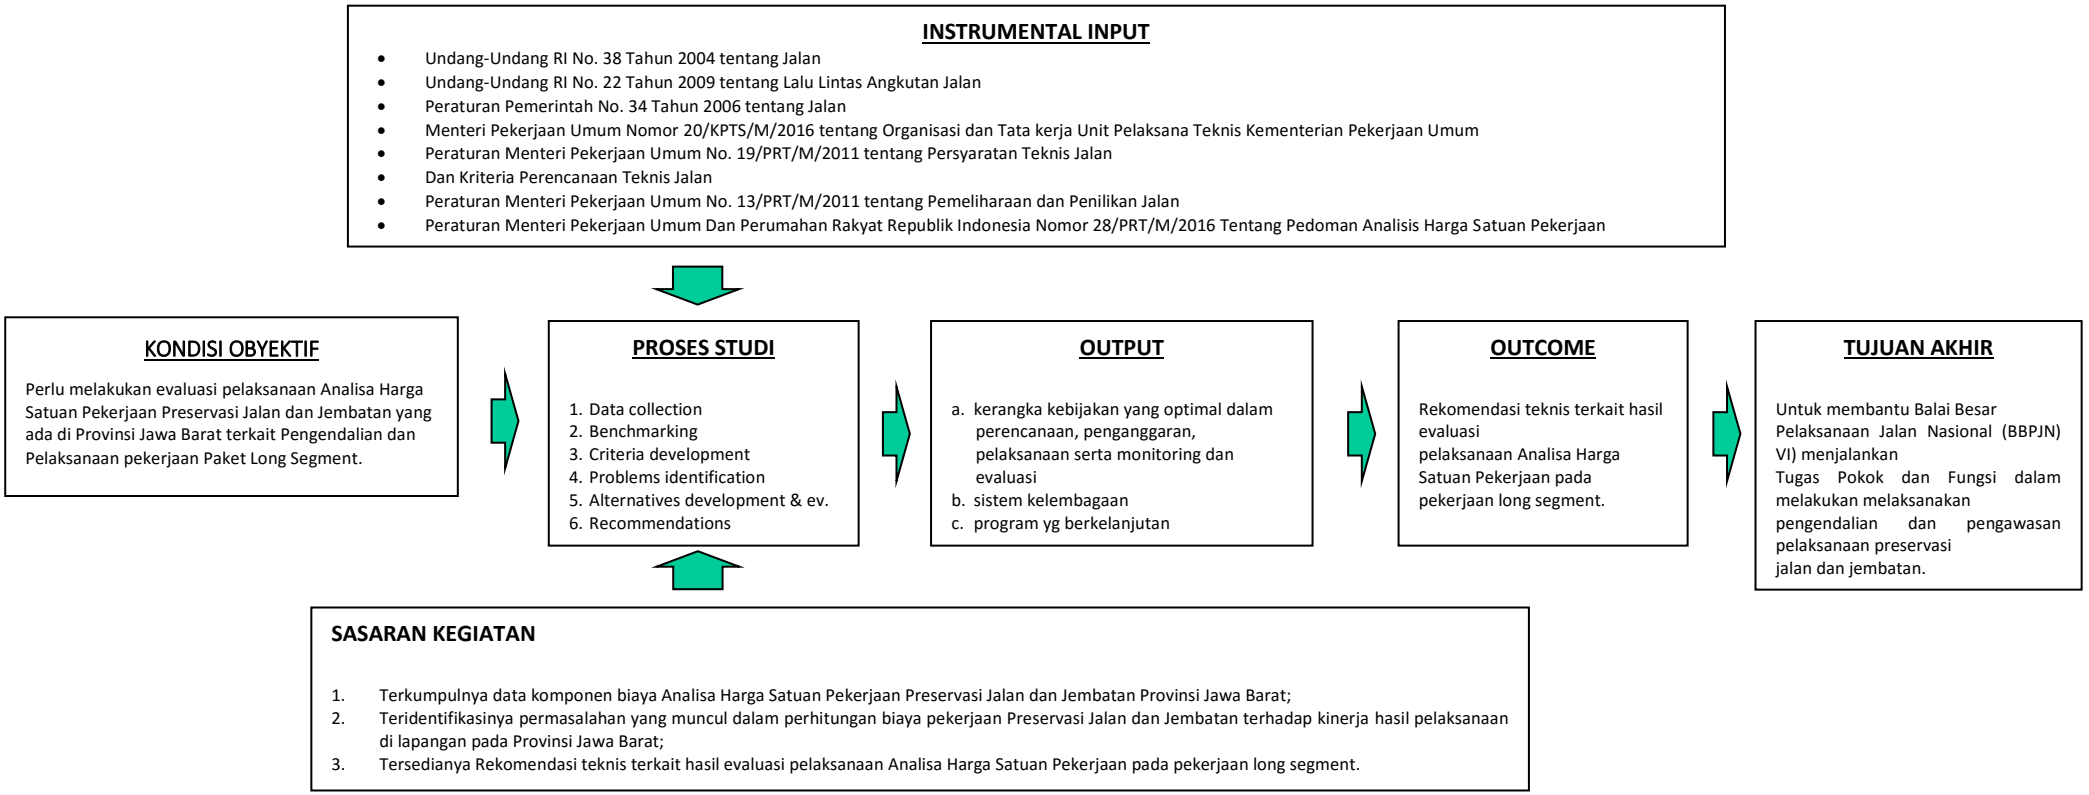

6.2.2 Diagram Alur Pekerjaan

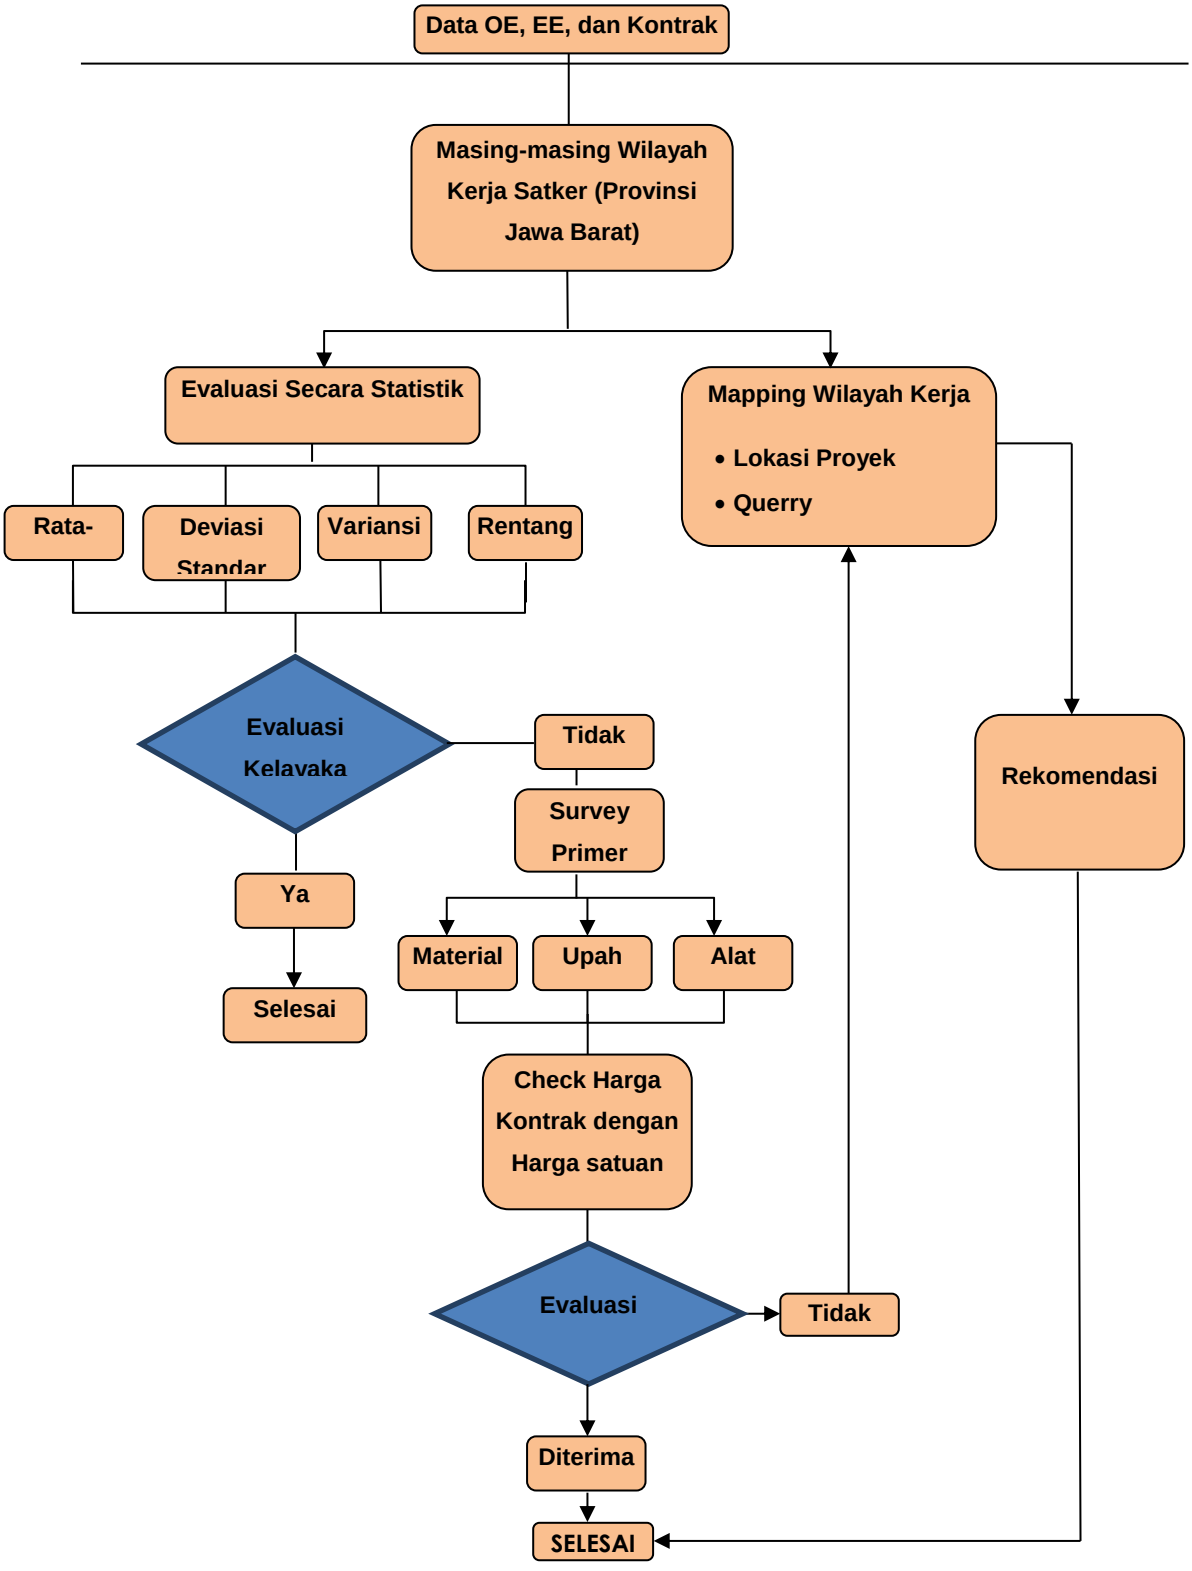

6.2.3 Persiapan

Studi ini diawali dengan kegiatan persiapan yang meliputi: mobilisasi tenaga ahli dan tenaga pendukung. Di samping persiapan tersebut, pada tahap awal ini, dilakukan juga pemantapan metodologi dan rencana kerja Konsultan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengantisipasi hal-hal yang belum tercakup dalam usulan teknis maupun perubahan-perubahan yang dianggap perlu. Termasuk dalam kegiatan ini adalah kegiatan pengumpulan referensi (studi pustaka). Referensi yang dimaksud dapat berupa text book, jurnal-jurnal, teks internet baik internasional maupun dari Indonesia.

Pada tahapan ini juga dilakukan identifikasi kebutuhan data untuk keperluan analisis lebih lanjut termasuk penyusunan rencana kegiatan pengumpulan data. Data yang akan dikumpulkan berupa data sekunder, yang bersumber dari lembaga independen maupun instansi-instansi terkait yang tentunya dapat dipertanggungjawabkan.

6.2.4 Tahap Pengumpulan Data

Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan kompilasi data yang bersifat sekunder (tidak langsung) sebagai dasar analisis. Untuk mendapatkan data yang secara kualitatif dan kuantitatif sesuai dengan kebutuhan studi, terlebih dahulu dilakukan persiapan, berupa penentuan item data subyek sekunder yang bersifat global dan makro.

Untuk keperluan Harga Satuan survai yang dilakukan antara lain:

1. Survai Instansional/Sekunder

Survai ini dilaksanakan untuk mendapatkan informasi penting melalui data sekunder yang melibatkan instansi yang terkait seperti satket dilingkungan BBPJN VI, Pemda, BPS, dan instansi lain terkait. Data sekunder adalah Lingkup Pekerjaan kegiatan dalam pengumpulan data primer antara lain:

- Kontrak Harga Pekerjaan Preservasi Jalan dan Jembatan di wilayah Jawa Barat pada tahun 2015 - 2019.
- Data harga dasar bangunantahun 2015 sampai tahun 2019.
- Data-data dari Biro Pusat Statistik (BPS) seperti, pertumbuhan ekonomi, PDRB, Indeks Harga, dsb.

Data – data khusuya dari paket preservasi jalan dan jembatan akan dianalisa masing masing dari Engineer Estimate, Owner Estimate dan Dokumen Kontrak dalam wilayah BPPJN VI. Kendala yang dari hasil survey instansional ini adalah ketidaklengkapan item OE, EE dan dokumen kontrak yang ada disetiap satuan kerja dalam BPPJN VI.

2. Survai Lapangan/Primer

Survai ini dilakukan untuk mendata harga-harga dasar untuk bangunan secara langsung ke sumbernya, seperti toko bangunan, lokasi quarry, tempat-tempat bahan olahan,sewa alat, dsb dimana hal tesebut sangat penting dalam menghitung harga satuan jembatan.

Data primer adalah Lingkup Pekerjaan kegiatan dalam pengumpulan data primer terutama:

- Harga Dasar (Upah/Bahan/Alat) tahun 2015 sampai 2019
- Harga Sewa tahun 2015 sampai 2019

Survey primer pada saat ini belum bisa untuk dilakukan karena menunggu waktu pengolahan data dari data sekunder untuk menentukan item-item yang paling berpengaruh dalam setiap devisi pekerjaan dari ke paket preservasi jalan dan jembatan dalam devisi wilayah satuan kerja (satker). Penyimpangan yang terjadi pada waktu analisa harga kan dilakukan pengecekan.

6.2.5 Tahapan Analisis

Analisis kemudian dilakukan, setelah data-data yang dikumpulkan tersebut, sekunder maupun primer, dikompilasi. Berikut adalah tujuan dalam menganalisis:

- Analisis terhadap harga dasar, analisis ini dilakukan untuk mengetahui karakteritik harga dasar ditiap-tiap derah survey.
- Analisis terhadap harga satuan kontrak kerja, analisis ini dilakukan untuk mengetahui karakteritik harga harga satuan kontrak kerja ditiap-tiap derah survey.
- Analisis terhadap tipologi daerah, hasil dari analisis ini diharapkan dapat menggambarkan tipologi wilayah yang ada di Indonesia terkait dengan harga bahan dasar dan harga satuan pekerjaan jembatan.
- Perhitungan indeks untuk kebutuhan forecasting harga satuan pekerjaan.

Adapun pekerjaan yang dilakukan dalam analisis harga dasar satuan adalah:

6.2.5.1 *Mapping* Lokasi Pekerjaan dan Gambaran Wilayah Satuan Kerja

Mapping lokasi dalam pengertian ini adalah mengidentifikasi semua paket pekerjaan di setiap satuan kerja. Keseluruhan pekerjaan tersebut akan di plot ke peta wilayah satuan kerja.

Kegunaan dari mengeplotkan setiap paket pekerjaan ini adalah untuk mendapatkan gambaran umum mengenai lokasi pekerjaan dan melihat lokasi tersebut terhadap *quarry*yang ada disekitar wilayah pekerjaan ataupun diluar wilayah kerja. *Mapping* lokasi ini sangat penting untuk menilai kewajaran dari harga satuan yang ada pada EE, OE dan kontrak yang disepakati oleh pemberi kerja dan pelaksana pekerjaan.

6.2.5.2 Analisa Penerimaan *Engineer Estimate, Owner Estimate* dan Dokumen Kontrak

Setelah mendapatkan Engineer Estimate, Owner Estimate dan Dokumen Kontrak maka keseluruhan item pekerjaan tersebut akan diklasifikasikan untuk mendapatkan analisis statistiknya. Analisis statistik ini dibituhkan untuk melihat kewajaran harga satuan dalam bobot pekerjaan yang mempengaruhi keseluruhan biaya proyek, deviasi standar dari setiap item pekerjaan yang ada pada masing-masing paket, dan analisa rentang penerimaan dari rata-rata harga satuan dalam tiap paket apakah telah memenuhi atau tidak.

1. Perhitungan Bobot Pekerjaan

   Bobot pekerjaan dihitung dengan mengalikan volume pekerjaan tiap-tiap item pekerjaan dengan rata-rata harga dasar satuan dari tiap pekerjaan. Hasil perkalian tersebut akan dibagi dengan total volume pekerjaan dikali dengan rata-rata harga dasar satuan.

   Penentuan bobot pekerjaan ini adalah untuk mendapatkan item pekerjaan yang paling mempengaruhi dalam keseluruhan paket yang dikerjakan oleh masing-masing satuan kerja. Item pekerjaan yang memiliki bobot terbesar adalah item pekerjaan yang paling mempengaruhi dari keseluruhan proyek. Bobot tersebut akan diurutkan menurut bobot yang paling mempengaruhi untuk melihat item pekerjaan mana yang akan dianalisa dan dilihat kewajarannya dengan hasil survey di lapangan.

2. Perhitungan Deviasi Standar

   Perhitungan deviasi standar adalah untuk menentukan deviasi yang terjadi disetiap item pekerjaan yang dianalisa dari tiap-tiap satuan kerja. Deviasi yang didapat menunjukkan besaran yang yang mungkin terjadi pada masing-masing pekerjaan.

3. Perhitungan Variansi

   Perhitungan variansi adalah perhitungan yang paling penting dalam analisa data OE, EE dan kontrak yang telah didapatkan. Perhitungan variansi adalah untuk menilai apakah deviasi standar yang telah didapatkan tidak berbeda jauh dengan rata-rata harga dasar satuan dari setiap masing-masing pekerjaan. Ini menunjukkan apakah deviasi tersebut dapat diterima atau tidak.

   Variansi didapat dengan cara membagikan standar deviasi terhadap rata-rata harga dasar satuan dari setiap item pekerjaan. Nilai variansi yang terkecil menunjukkan bahwa perbedaan antara harga dasar satuan tiap paketnya dalam setiap item pekerjaan tidak berbeda jauh.

Setiap data yang memiliki variansi terbesar akan diklasifikasikan dan diurutkan sehingga didapat item yang paling memiliki nilai variansi terbesar dalam setiap satuan kerja.

4. Perhitungan Rentang Minimum dan Maksimum Harga Dasar Satuan

   Perhitungan rentang maksimum dan minimum dalam analisa ini adalah untuk mendapatkan batasan minimum dan maksimum dari setiap harga dasar satuan untuk masing-masing pekerjaan.

   Untuk menentukan rentang minimum dan maksimum terlebih dahulu ditentukan tingkat kepercayaan yang akan digunakan dalam analisis. Dalam analisa ini digunakan tingkat kepercayaan 95%; 80% dan 70%. Dari penentuan tingkat kepercayaan tersebut akan dihasilkan nilai z yang tiap-tiap tingkat kepercayaan adalah 1,96; 1,285; dan 1,035. Setelah menentukan nilai z maka dapat dihitung rentang minimum dan maksimum dengan rumus:

   Rumusan untuk mendapatkan rentang minimum adalah:

$$Xmin = \mu - (z.\sigma)$$

   Rumusan untuk mendapatkan rentang maksimum adalah:

$$Xmaks = \mu + (z.\sigma)$$

   Dimana:

   Xmin : Rentang minimum

   Xmaks : Rentang maksimum

   μ : Rata-rata harga dasar satuan

   σ : Deviasi Standar

6.2.5.3 Analisa Harga Dasar Satuan Lapangan terhadap Analisa Harga Satuan Hasil OE, EE dan Dokumen Kontrak

Setelah melakukan analisa statistik terhadap OE, EE dan dokumen kontrak, data yang telah teridentifikasi dari pembobotan, standar deviasi, variansi dan rentang minimum dan maksimum maka data-data tersebut akan dilihat nilai kewajarannya secara langsung dilapangan.

Data-data tersebut akan dibandingkan satu sama lain dan melihat apakah harga yang tertera dalam dokumen OE, EE dan dokumen kontrak tersebut memiliki selisih yang cukup besar dengan harga sebenarnya. Pelaksanaan survey ini dimaaksudkan untuk melihat faktor-faktor apa sajakah yang mungkin mempengaruhi sehingga harga dasar satuan yang dibandingkan memiliki perbedaan yang cukup besar.

Hal-hal yang mungkin mempengaruhi harga dasar satuan lapangan dengan harga dasar satuan OE, EE dan Dokumen Kontrak adalah:

- Jarak angkut yang cukup jauh antara lokasi paket pekerjaan dengan lokasi *quarry*
- Kualitas dari item pekerjaan
- Umur alat yang digunakan
- Kebijakan-kebijakan lain yang mempengaruhi

Keseluruhan kemungkinan tersebut akan diidentifikasi dan akan mempengaruhi rekomendasi yang akan diberikan sehingga didapatkan harga dasar satuan yang dapat digunakan untuk masing-masing wilayah satuan kerja dan BPPJN VI secara umumnya.

6.2.6 Tahapan Kesimpulan dan Rekomendasi

Dalam tahapan ini akan diformulasikan temuan-temuan, hasil identifikasi dan analisis yang telah dilakukan dalam studi ini, untuk pada gilirannya dapat dijadikan masukan bagi implementasi maupun bagi pengembangan lanjut Penyusunan Harga Dasar Satuan Program Pemeliharaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan.

Identifikasi harga dasar satuan tersebut akan dikelompokkan menurut tingkat penyimpangannya dan menurut tiap item pekerjaannya, baik dari pembobotan, deviasi standar, variansi dan rentang maksimum maupun minimum yang dapat diterima tingkat kewajarannya.

BAB VII
JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan disusun oleh konsultan berdasarkan pemahaman dan pengalaman konsultan dalam melakukan kegiatan sejenis, konsultan melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwal yang telah disusun.

Jadwal pelaksanaan kegiatan memuat kegiatan Tim Konsultan pada periode kontrak dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

LAPORAN PROGRAM MUTU

EVALUASI PELAKSANAAN ANALISA HARGA SATUAN PEKERJAAN
PRESERVASI JALAN DAN JEMBATAN PROVINSI JAWA BARAT

PT. SARANA MULTI DAYA ENGINEERING CONSULTANT	No. Dok.:	Tgl. Diterbitkan:	Hal.: 32
	No. Rev.: 00		Paraf:

No	Kegiatan	Bulan Ke -																			
		1				2				3				4				5			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	**SPMK Terbit**																				
2	**Persiapan dan Penyusunan Metode Kerja**																				
3	**Survey, Pengumpulan Data dan Pengolahan Data**																				
3.1	Inventarisasi Data Sekunder																				
3.2	Survey Lapangan																				
	- Persiapan Survey																				
	- Pelaksanaan Survey																				
3.3	Pengolahan dan Analisis Data																				
4	**Presentasi dan Diskusi**																				
5	**Pelaporan**																				
5.1	RMK																				
5.2	Laporan Pendahuluan																				
5.3	Laporan Antara																				
5.4	Analisis Akhir dan Rekomendasi																				
5.5	Perbaikan Laporan																				
5.6	Laporan Akhir																				

BAB VIII
JADWAL PENUGASAN TENAGA AHLI

Konsultan kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Preservasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Jawa Barat, telah menyusun jadwal penugasan Tenaga Ahli sebagai berikut:

a. Profesional Staff

No	Nama Personel	Perusahaan	Lingkup Keahlian	Posisi Diusulkan	Uraian Pekerjaan	Jumlah Orang Bulan
1	Ir. Prijambodo, MT	PT. Sarana Multi Daya	Ketua Tim/Ahli Utama Teknik Jalan	Ketua Tim	Memimpin dan mengkoordinir seluruh kegiatan anggota tim dalam pelaksanaan pekerjaan sampai dengan pekerjaan dinyatakan selesai, serta bertanggung jawab penuh terhadap produk yang dihasilkan.	5 OB
2	Victor Boris Dalimartin, ST, MT	PT. Sarana Multi Daya	Ahli Madya Teknik Manajemen Konstruksi	Ahli Manajemen Konstruksi	1. Melakukan kajian pustaka dan peraturan perundang-undangan terkait dengan kebijakan preservasi jalan dan jembatan dengan skema longsegment. 2. Menyusun data paket pekerjaan terkait preservasi jalan dan jembatan dengan skema longsegment selama beberapa tahun terakhir. 3. Melakukan inventarisasi yang dibutuhkan terkait biaya preservasi jalan dan jembatan dengan skema longsegment. 4. Menganalisa komponen teknis pekerjaan jalan dan mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam perhitungan biaya pekerjaan Preservasi Jalan dan Jembatan terhadap kinerja hasil pelaksanaan di lapangan pada Provinsi Jawa Barat.	5 OB
3	Ir. Tedy Mutejo, MT	PT. Sarana Multi Daya	Ahli Muda Manajemen Proyek	Ahli Quantity/Estimasi Biaya	1. Melakukan kajian pustaka dan peraturan perundang-undangan terkait dengan kebijakan preservasi jalan dan jembatan dengan skema longsegment. 2. Melakukan inventarisasi data yang dibutuhkan terkait biaya preservasi jalan dan jembatan.	5 OB

No	Nama Personel	Perusahaan	Lingkup Keahlian	Posisi Diusulkan	Uraian Pekerjaan	Jumlah Orang Bulan
					3. Menganalisa komponen teknis pekerjaan jalan dan mengidentifikasi permasalahan yang muncul dalam perhitungan biaya pekerjaan Preservasi Jalan dan Jembatan terhadap kinerja hasil pelaksanaan di lapangan pada Provinsi Jawa Barat.	
4	Riyadi Agung, S.Si, MSE	PT. Sarana Multi Daya	Ahli Statistik	Ahli Statistik	1. Melakukan kajian pustaka dan peraturan perundang-undangan terkait dengan kebijakan preservasi jalan dan jembatan dengan skema longsegment 2. Melakukan inventarisasi yang dibutuhkan terkait biaya preservasi jalan dan jembatan dengan skema longsegment. 3. Menyusun grafik, hasil telaah data, dan alat bantu lainnya yang digunakan untuk analisa laporan dan rekomendasi keluaran.	5 OB

b. Sub Profesional Staff

No	Nama Personel	Perusahaan	Lingkup Keahlian	Posisi Diusulkan	Uraian Pekerjaan	Jumlah Orang Bulan
1	Muhammad Fatkhrurrozi, ST	PT. Sarana Multi Daya	-	Asisten Tenaga Ahli Manajemen Konstruksi	Membantu kelancaran pekerjaan, tenaga ahli tersebut di atas masing-masing dibantu tenaga asisten	5 OB
2	Fita Ariyanti, ST, MT	PT. Sarana Multi Daya	-	Asisten Tenaga Ahli Jalan	Membantu kelancaran pekerjaan, tenaga ahli tersebut di atas masing-masing dibantu tenaga asisten	5 OB

c. Tenaga Penunjang

No	Nama Personel	Perusahaan	Lingkup Keahlian	Posisi Diusulkan	Uraian Pekerjaan	Jumlah Orang Bulan
1	Ardisuryadi	PT. Sarana Multi Daya	Operator Komputer	Operator Komputer	Membantu Tenaga Ahli dalam pengolahan data dan penyusunan laporan	5 OB
2	Umar Wahyudin	PT. Sarana Multi Daya	Operator Komputer	*Office Boy*	Membantu aktifitas perkantoran yang bersifat Non-Teknis	5 OB

Jadwal penugasan personil secara spesifik untuk kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Preservasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut.

No	Posisi	Nama Personil	Bulan Ke -																				JML OB
			1				2				3				4				5				
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
I	**TENAGA AHLI**																						
1	Ketua Tim (*Team Leader*)	Ir. Prijambodo, MT																					5
2	Tenaga Ahli Teknik Manajemen Konstruksi	Victor Boris Dalimartin, ST, MT																					5
3	Tenaga Ahli Estimasi Biaya	Ir. Tedy Mutejo, MT																					5
4	Tenaga Ahli Statistika	Riyadi Agung, S.Si, MSE																					5
II	**ASSISTEN TENAGA AHLI**																						
1	Asisten TA Teknik Manajemen Konstruksi	Muhammad Fatkhrurrozi, ST																					5
2	Asisten TA Teknik Jalan	Fita Ariyanti, ST, MT																					5
III	**TENAGA PENDUKUNG**																						
1	Operator Komputer/*Typist*	Ardisuryadi																					5
2	Operator Komputer/*Typist*	Umar Wahyudin																					5

BAB IX
JADWAL ARUS KAS

NO.	URAIAN	KONTRAK TOTAL HARGA (Rp)	TERMIN 1 TOTAL HARGA (Rp)	TERMIN 2 TOTAL HARGA (Rp)	TERMIN 3 TOTAL HARGA (Rp)
I.	BIAYA LANGSUNG PERSONIL				
A	BIAYA PERSONIL/TENAGA AHLI	Rp. 623,750,000	Rp. 124,750,000	Rp. 374,250,000	Rp. 124,750,000
B	ASISTEN TENAGA AHLI	Rp. 77,500,000	Rp. 15,500,000	Rp. 46,500,000	Rp. 15,500,000
C	TENAGA PENDUKUNG	Rp. 40,000,000	Rp. 8,000,000	Rp. 24,000,000	Rp. 8,000,000
	TOTAL BIAYA LANGSUNG PERSONIL	Rp. 741,250,000	Rp. 148,250,000	Rp. 444,750,000	Rp. 148,250,000
II.	BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL				
A.	Uang Penginapan Dan Transport Perjalanan Dinas	Rp. 26,250,000	Rp. -	Rp. 15,750,000	Rp. 10,500,000
B.	Biaya Fasilitas Kantor (Harga Satuan Tetap)	Rp. 59,050,000	Rp. 3,900,000	Rp. 39,400,000	Rp. 15,750,000
	JUMLAH BIAYA LANGSUNG NON PERSONIL	Rp. 85,300,000	Rp. 3,900,000	Rp. 55,150,000	Rp. 26,250,000
	Biaya Pekerjaan	Rp. 826,550,000	Rp. 152,150,000	Rp. 499,900,000	Rp. 174,500,000
	PPN 10%	Rp. 82,655,000	Rp. 15,215,000	Rp. 49,990,000	Rp. 17,450,000
	TOTAL	Rp. 909,205,000	Rp. 167,365,000	Rp. 549,890,000	Rp. 191,950,000

BAB X
RENCANA, METODE VERIFIKASI, VALIDASI, MONITORING, EVALUASI, INSPEKSI, DAN KRITERIA PENERIMAAN

No.	Pemeriksaan	Metode	Kriteria Penerimaan	Waktu
1.	PROGRAM MUTU	Sesuai Persyaratan KAK	Kontrak Konsultan/KAK	**Selambat-lambatnya 30 hari kalender** sejak ditetapkan tanggal SPMK
2.	LAPORAN PENDAHULUAN	Sesuai Persyaratan KAK	Kontrak Konsultan/KAK	**selambat-lambatnya 30 hari kalender** sejak ditetapkan tanggal SPMK
3.	LAPORAN ANTARA	Sesuai Persyaratan KAK	Kontrak Konsultan/KAK	**selambat-lambatnya 90 hari kalender** sejak ditetapkan tanggal SPMK
4.	LAPORAN AKHIR	Sesuai Persyaratan KAK	Kontrak Konsultan/KAK	**selambat-lambatnya 150 hari kalender** sejak ditetapkan tanggal SPMK
5.	RINGKASAN EKSEKUTIF/*EXECUTIVE SUMMARY*	Sesuai Persyaratan KAK	Kontrak Konsultan/KAK	**selambat-lambatnya 150 hari kalender** sejak ditetapkan tanggal SPMK

BAB XI
DAFTAR KRITERIA PENERIMAAN

No.	Pemeriksaan Kegiatan	Kriteria Penerimaan	Referensi	Ket.
1.	PROGRAM MUTU	Kontrak Konsultan/KAK	Dokumen Kontrak	-
2.	LAPORAN PENDAHULUAN	Kontrak Konsultan/KAK	Dokumen Kontrak	-
3.	LAPORAN ANTARA	Kontrak Konsultan/KAK	Dokumen Kontrak	-
4.	LAPORAN AKHIR	Kontrak Konsultan/ KAK	Dokumen Kontrak	-
5.	RINGKASAN EKSEKUTIF/*EXECUTIVE SUMMARY*	Kontrak Konsultan/ KAK	Dokumen Kontrak	-

BAB XII
DAFTAR INDUK DOKUMEN

Daftar induk dokumen yang dipakai untuk konsultan adalah dokumen kontrak Nomor 456/HK.02.03/PRESLANII.01/Bv/2019 serta dasar hukum yang digunakan dalam pekerjaan ini, yaitu:

1. Undang-Undang RI No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
2. Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan.
3. Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2006 tentang Jalan.
4. Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/KPTS/M/2016 tentang Organisasi dan Tata kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pekerjaan Umum.
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.19/PRT/M/2011 tentang Persyaratan Teknis Jalan Dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan.
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.13/PRT/M/2011 tentang Pemeliharaan dan Penilikan Jalan.
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 28/PRT/M/2016 Tentang Pedoman Analisis Harga Satuan Pekerjaan Bidang Pekerjaan Umum.

BAB XIII
DAFTAR INDUK REKAMAN

Nama Rekaman Bukti Kerja	Lokasi Penyimpanan	Masa Simpan Rekaman
Evaluasi Pelaksanaan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Preservasi Jalan Dan Jembatan Provinsi Jawa Barat, terdiri atas: 1. PROGRAM MUTU 2. LAPORAN PENDAHULUAN 3. LAPORAN ANTARA 4. LAPORAN AKHIR 5. RINGKASAN EKSEKUTIF/*EXECUTIVE SUMMARY*	BBPJN VI, Unit Kerja Preservasi dan Peralatan II	5 tahun sebagai arsip, *hard copy*, dan *soft copy*

BAB XIV
DAFTAR SIMAK

NO.	PEMERIKSA	JENIS PEMERIKSAAN	URAIAN		
I	KEMASAN	ADA IDENTITAS PEMILIK PERUSAHAAN	√	YA	TIDAK
		TERCANTUM IDENTITAS PERUSAHAAN	√	YA	TIDAK
		JUDUL JELAS	√	YA	TIDAK
		TERTERA TAHUN PELAKSANAAN	√	YA	TIDAK
II	LEMBAR PENGESAHAN	ADA LEMBAR PENGESAHAN	√	YA	TIDAK
		MENCANTUMKAN TIGA PIHAK YANG TERLIBAT, DISUSUN OLEH, DIPERIKSA OLEH, DISAHKAN OLEH	√	YA	TIDAK
		ADA KOLOM STATUS, DISTRIBUSI, DAN TANGGAL DISTRIBUSI	√	YA	TIDAK
		ADA PENOMORAN DOKUMEN	√	YA	TIDAK
		ADA IDENTIFIKASI TANGGAL PENERBITAN	√	YA	TIDAK
III	DAFTAR ISI	DAFTAR ISI LENGKAP MEMUAT SUBTANSI RMK	√	YA	TIDAK
1	LATAR BELAKANG	ADA PENJELASAN LATAR BELAKANG PROYEK PADA RMK	√	YA	TIDAK
		INFORMATIF DAN DAPAT MEMBERIKAN GAMBARAN PENJELASAN LATAR BELAKANG	√	YA	TIDAK
2	INFORMASI KEGIATAN	BERISI DATA MENGENAI INFORMASI KEGIATAN	√	YA	TIDAK
		IDENTITAS PERUSAHAAN DAN ALAMATNYA	√	YA	TIDAK
		ASPEK LEGAL HUKUM KONTRAK, NOMOR DAN TANGGAL KONTRAK	√	YA	TIDAK

		SUMBER PENDANAAN, PROPORSINYA, DAN NOMOR PENDANAAN	√	YA	TIDAK
		TERCANTUM PAKET KEGIATAN	√	YA	TIDAK
		ADA NAMA PEJABAT DAN ALAMAT (TL)	√	YA	TIDAK
		ADA IDENTIFIKASI PAGU BIAYA		YA	TIDAK
3	SASARAN MUTU KEGIATAN	ADA SASARAN MUTU KEGIATAN	√	YA	TIDAK
		TERSEDIA SASARAN MUTU BAGIAN	√	YA	TIDAK
		SASARAN MUTU RELEVAN	√	YA	TIDAK
4	PERSAYARATAN TEKNIS DAN ADMINISTRASI	APA ADA KAK, SPESISIFIKASI TEKNIS, SNI, NSPM	√	YA	TIDAK
		APA ADA PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	√	YA	TIDAK
		APA ADA KONTRAK/SURAT PENUNJUKAN PEMENANG	√	YA	TIDAK
5	STRUKTUR ORGANISASI	ADA STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN/SNVT/PPK	√	YA	TIDAK
		LENGKAP DAN SESUAI KEBUTUHAN KONTRAK	√	YA	TIDAK
		MENUNJUKAN GARIS INSTRUKSI DAN KOORDINASI	√	YA	TIDAK
6	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB, PERSONIL	ADA URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB, DAN WEWENANG	√	YA	TIDAK
		LENGKAP UNTUK MASING-MASING PERSONIL YANG TERLIBAT	√	YA	TIDAK
		ADA PENUGASAN UNTUK PENANGANAN MUTU	√	YA	TIDAK
		ADA PETUGAS YANG MENGENDALIKAN MASALAH DENGAN EKSTERNAL, PEMERINTAH DAN MASYARAKAT	√	YA	TIDAK

		ADA PENGATURAN PELIMPAHAN WEWENANG JIKA TERJADI KONDISI KHUSUS	√	YA	TIDAK
7	BAGAN ALIR PELAKSANAAN KEGIATAN	ADA BAGAN ALIR PELAKSANAAN KEGIATAN	√	YA	TIDAK
		MENGGUNAKAN KAIDAH *FLOW CHART*	√	YA	TIDAK
		MEMUAT SELURUH AKTIVITAS UTAMA KEGIATAN DAN LENGKAP	√	YA	TIDAK
		SETIAP SIMPUL KEGIATAN MENUNJUKAN REFERENSI KEPADA PROSEDUR ATAU INSTRUKSI KERJA	√	YA	TIDAK
		SETIAP KEGIATAN PENGECEKAN DAN PENGETESAN DIREFERENSIKAN DENGAN PERSYARATAN ATAU KRITERIA PENERIMANNYA	√	YA	TIDAK
8	JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN	TERSEDIA JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN	√	YA	TIDAK
		DALAM BENTUK BAR DIAGRAM	√	YA	TIDAK
		MENGURAI RINCI ITEM PEKERJAAN	√	YA	TIDAK
		ADA KOLOM UNTUK REKAMAN REALISASI PROGRES	√	YA	TIDAK
9	JADWAL PERALATAN	ADA JADWAL PERALATAN	√	YA	TIDAK
		SESUAI JUMLAH DENGAN KEBUTUHAN	√	YA	TIDAK
10	JADWAL MATERIAL	ADA JADWAL MATERIAL	√	YA	TIDAK
		SESUAI JUMLAH DENGAN KEBUTUHAN	√	YA	TIDAK
11	MOBILISASI DAN JADWAL TUGAS PERSONIL	SESUAI DENGAN KEBUTUHAN UNTUK MENDUKUNG PELAKSANAAN PEKERJAAN	√	YA	TIDAK
		PELAKSANAAN KEGIATAN MENCAKUP PERSONIL INTI	√	YA	TIDAK
		MENUNJUKAN JADWAL KEGIATAN	√	YA	TIDAK

12	JADWAL ARUS KAS	ADA JADWAL/RENCANA PENERIMAAN (*CASH IN*)	√	YA	TIDAK
		ADA JADWAL/RENCANA PENERIMAAN (*CASH OUT*)	√	YA	TIDAK
		SESUAI JUMLAH DENGAN KEBUTUHAN	√	YA	TIDAK
13	RENCANA, METODE VERIFIKASI, VALIDASI, MONITORING, EVALUASI	VERIFIKASI DILAKUKAN TERHADAP SELURUH LAPORAN	√	YA	TIDAK
		MONITORING DILAKUKAN TERHADAP SELURUH LAPORAN	√	YA	TIDAK
		EVALUASI DILAKUKAN TERHADAP SELURUH KEGIATAN	√	YA	TIDAK
		PENGUJIAN PENERIMAAN DILAKUKAN TERHADAP SELURUH KEGIATAN	√	YA	TIDAK
14	DAFTAR INDUK DOKUMEN	TERSEDIA DAFTAR INDUK DOKUMEN	√	YA	TIDAK
		MERINCIKAN JENIS DOKUMEN YANG MEMILIKI ORGANISASI, DOKUMEN EKSTERNAL, DOKUMEN INTERNAL DAN DOKUMEN SISTEM MUTU	√	YA	TIDAK
		LENGKAP DAN SESUAI DENGAN KEBUTUHAN	√	YA	TIDAK
		DOKUMEN DIBERI KODE PENOMORAN	√	YA	TIDAK
		ADA DAFTAR PROSEDUR	√	YA	TIDAK
		SESUAI DENGAN KEBUTUHAN PROSEDUR UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN	√	YA	TIDAK
		PROSEDUR DIBERI KODE PENOMORAN	√	YA	TIDAK
		ADA DAFTAR INSTRUKSI KERJA	√	YA	TIDAK
		SESUAI DENGAN KEBUTUHAN INSTRUKSI KERJA UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN	√	YA	TIDAK
		INSTRUKSI KERJA DIBERI KODE PENOMORAN	√	YA	TIDAK

15	DAFTAR INDUK REKAMAN	TERSEDIA DAFTAR INDUK REKAMAN	√	YA	TIDAK
		DOKUMEN DIBERI KODE PENOMORAN	√	YA	TIDAK
		DOKUMEN REKAMAN TERSIMPAN DENGAN RAPI DAN MUDAH UNTUK MENDAPATKANNYA	√	YA	TIDAK

TANDA TANGAN	**CATATAN**
NAMA :	
JABATAN :	
